


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic '10							20 dic '10							27 dic '10							03 e
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	
1		Proyecto Rips	173 días	jue 16/12/10	lun 15/08/11																						
2		Inicio proyecto sanidad Rips	1 día	jue 16/12/10	jue 16/12/10																						
3		Plan de proyecto	8 días	vie 17/12/10	mar 28/12/10																						
4		Estructura de los archivos RIPS	5 días	lun 03/01/11	vie 07/01/11																						
5		Diseño de la Base de Datos	3 días	mié 05/01/11	vie 07/01/11																						
6		Diseño arquitectura de conexiones	3 días	lun 10/01/11	mié 12/01/11																						
7		Módulo de autenticación y acceso	4 días	jue 13/01/11	mar 18/01/11																						
8		Módulo de manejo de errores	3 días	mar 18/01/11	jue 20/01/11																						
9		Modulo conexión contratos vigentes	3 días	vie 21/01/11	mar 25/01/11																						
10		Modulo usuarios finales	3 días	mié 26/01/11	vie 28/01/11																						
11		desarrollar el Submódulo Crear nuevo proceso de cargue	5 días	vie 28/01/11	jue 03/02/11																						

Proyecto: Proyecto1.mpp
Fecha: lun 27/12/10


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

ene '11 10 ene '11 17 ene '11 24 ene '11 31 ene '11 07 feb '11 14 feb '11

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

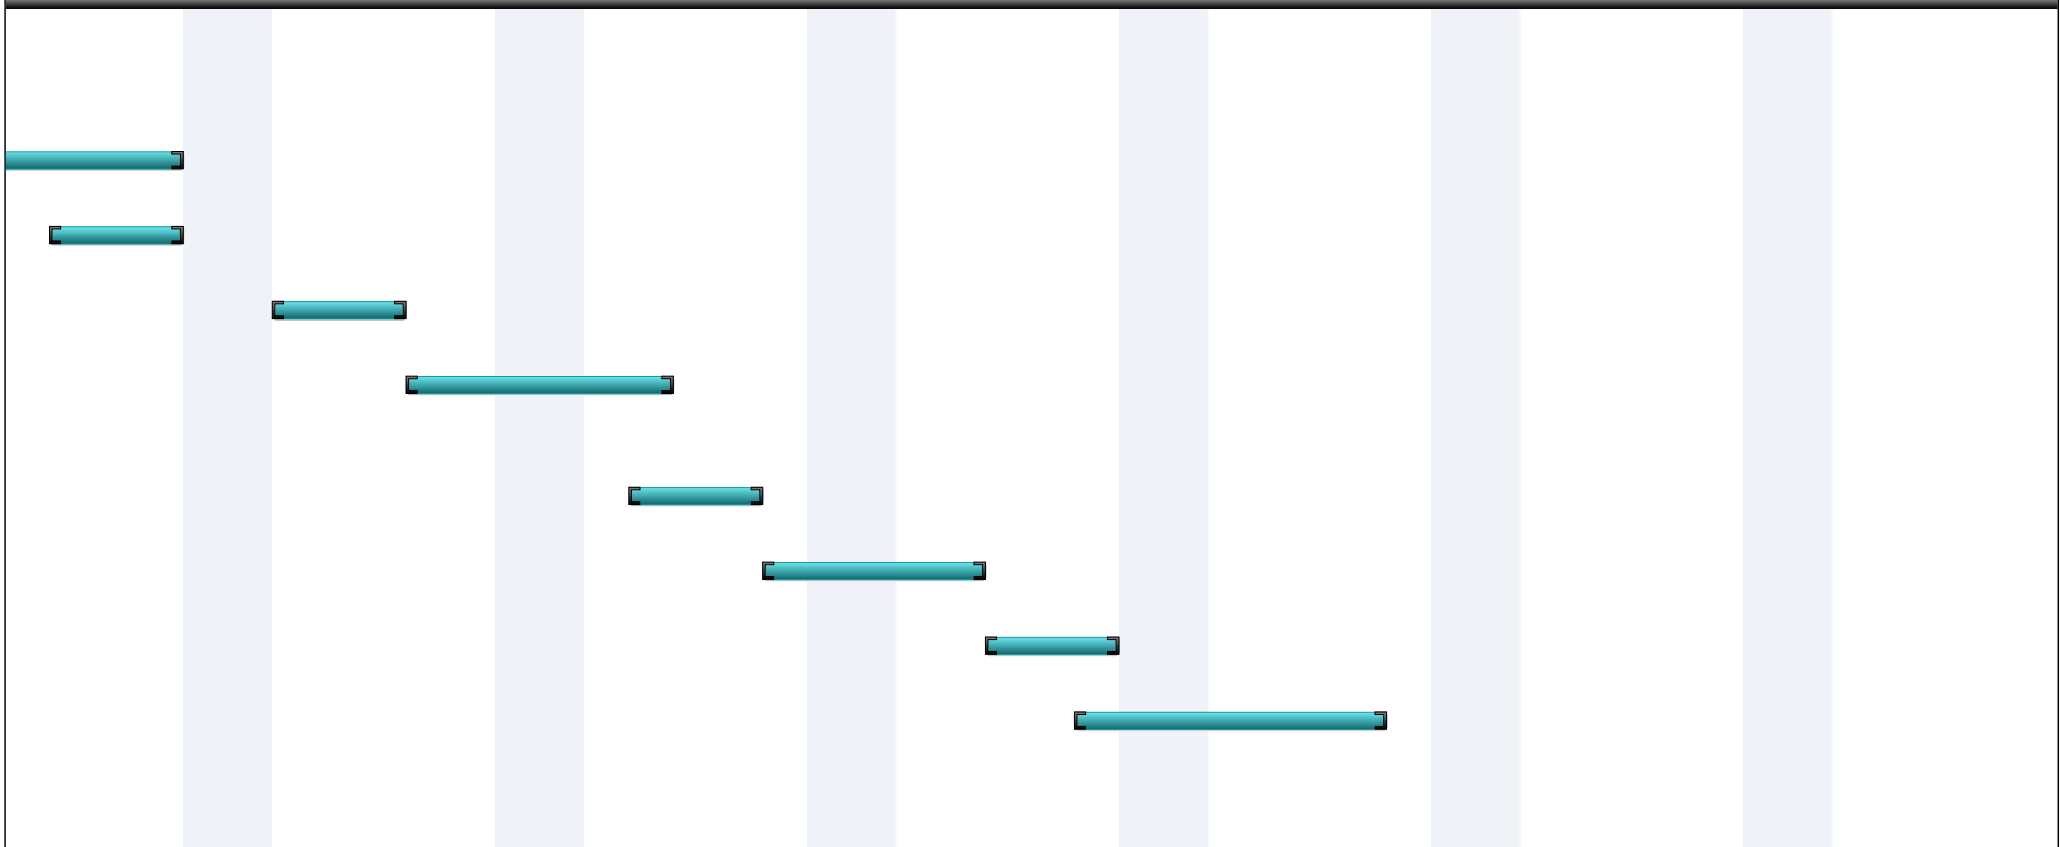

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

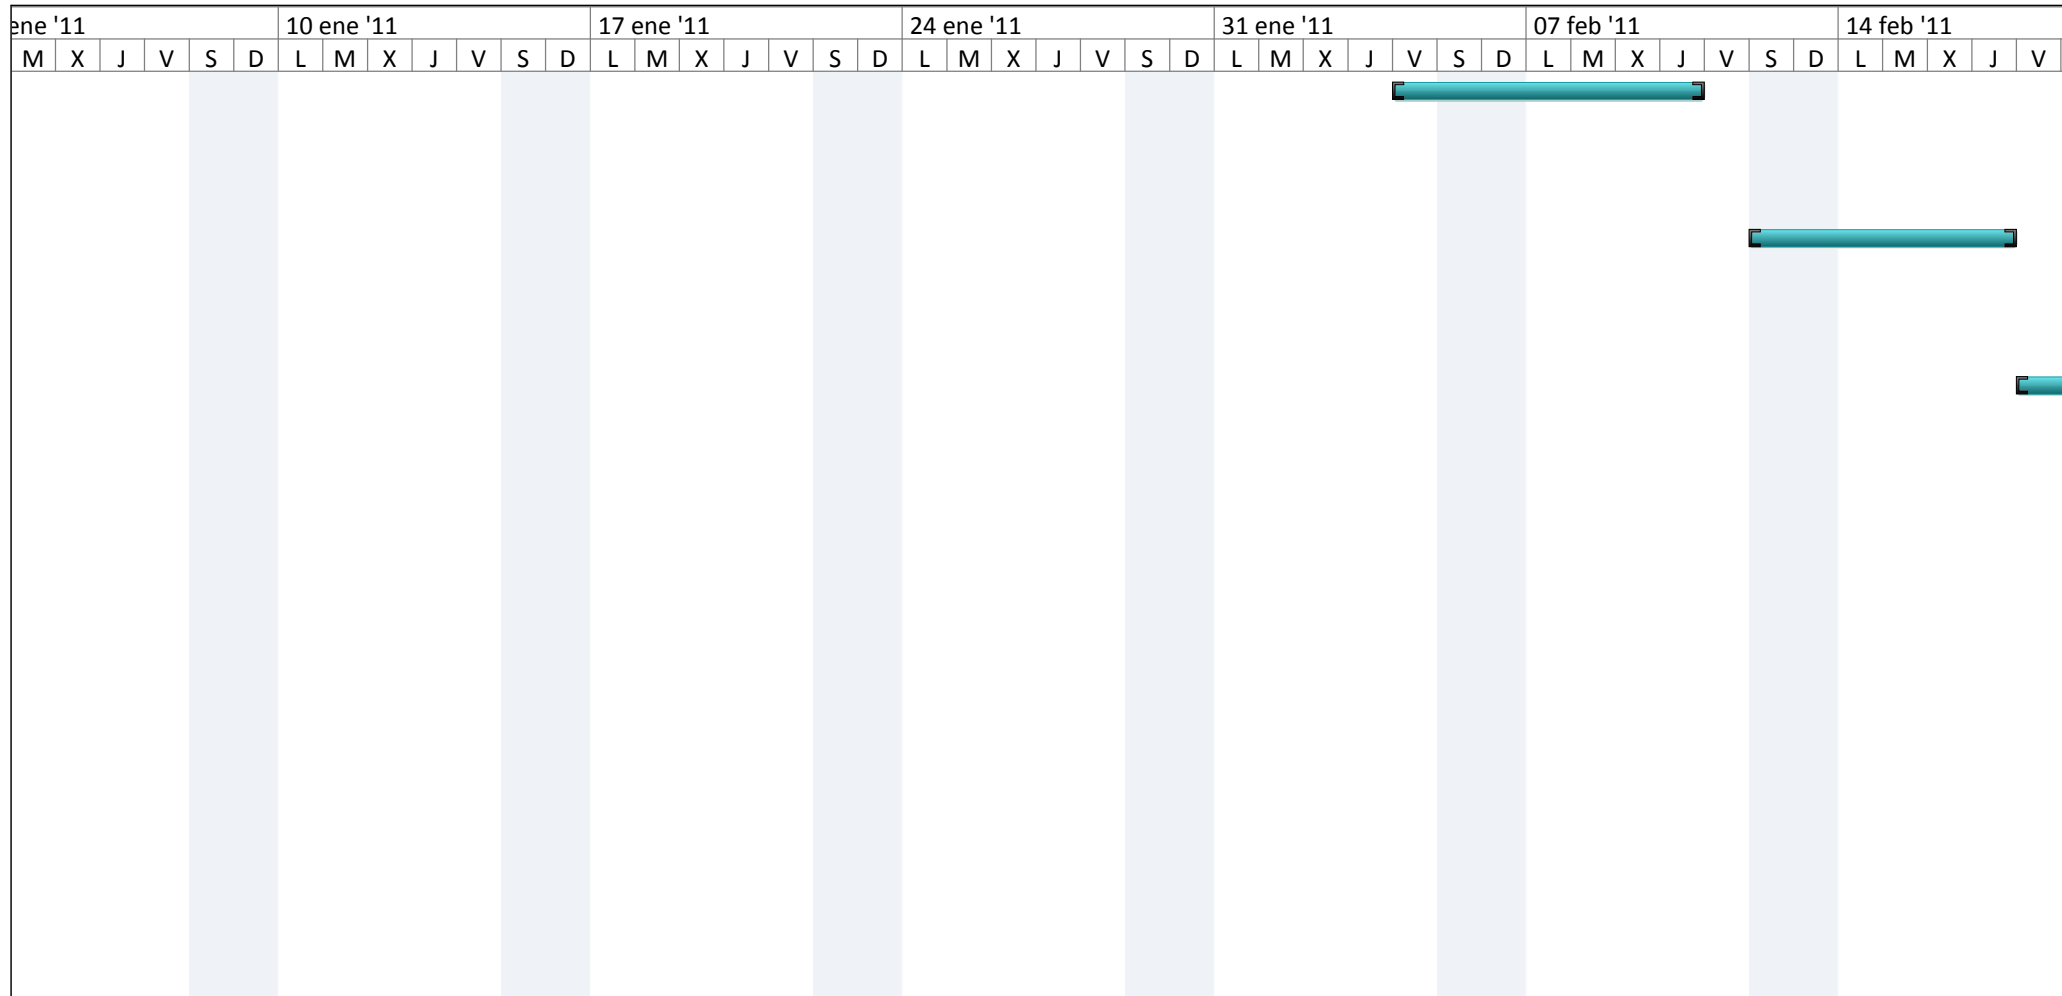



















Proyecto: Proyecto1.mpp
 Fecha: lun 27/12/10

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

ene '11					10 ene '11					17 ene '11					24 ene '11					31 ene '11					07 feb '11					14 feb '11										
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D

Proyecto: Proyecto1.mpp
Fecha: lun 27/12/10


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

		21 feb '11							28 feb '11							07 mar '11							14 mar '11							21 mar '11							28 mar '11							04 abr '11								
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M




--	--

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

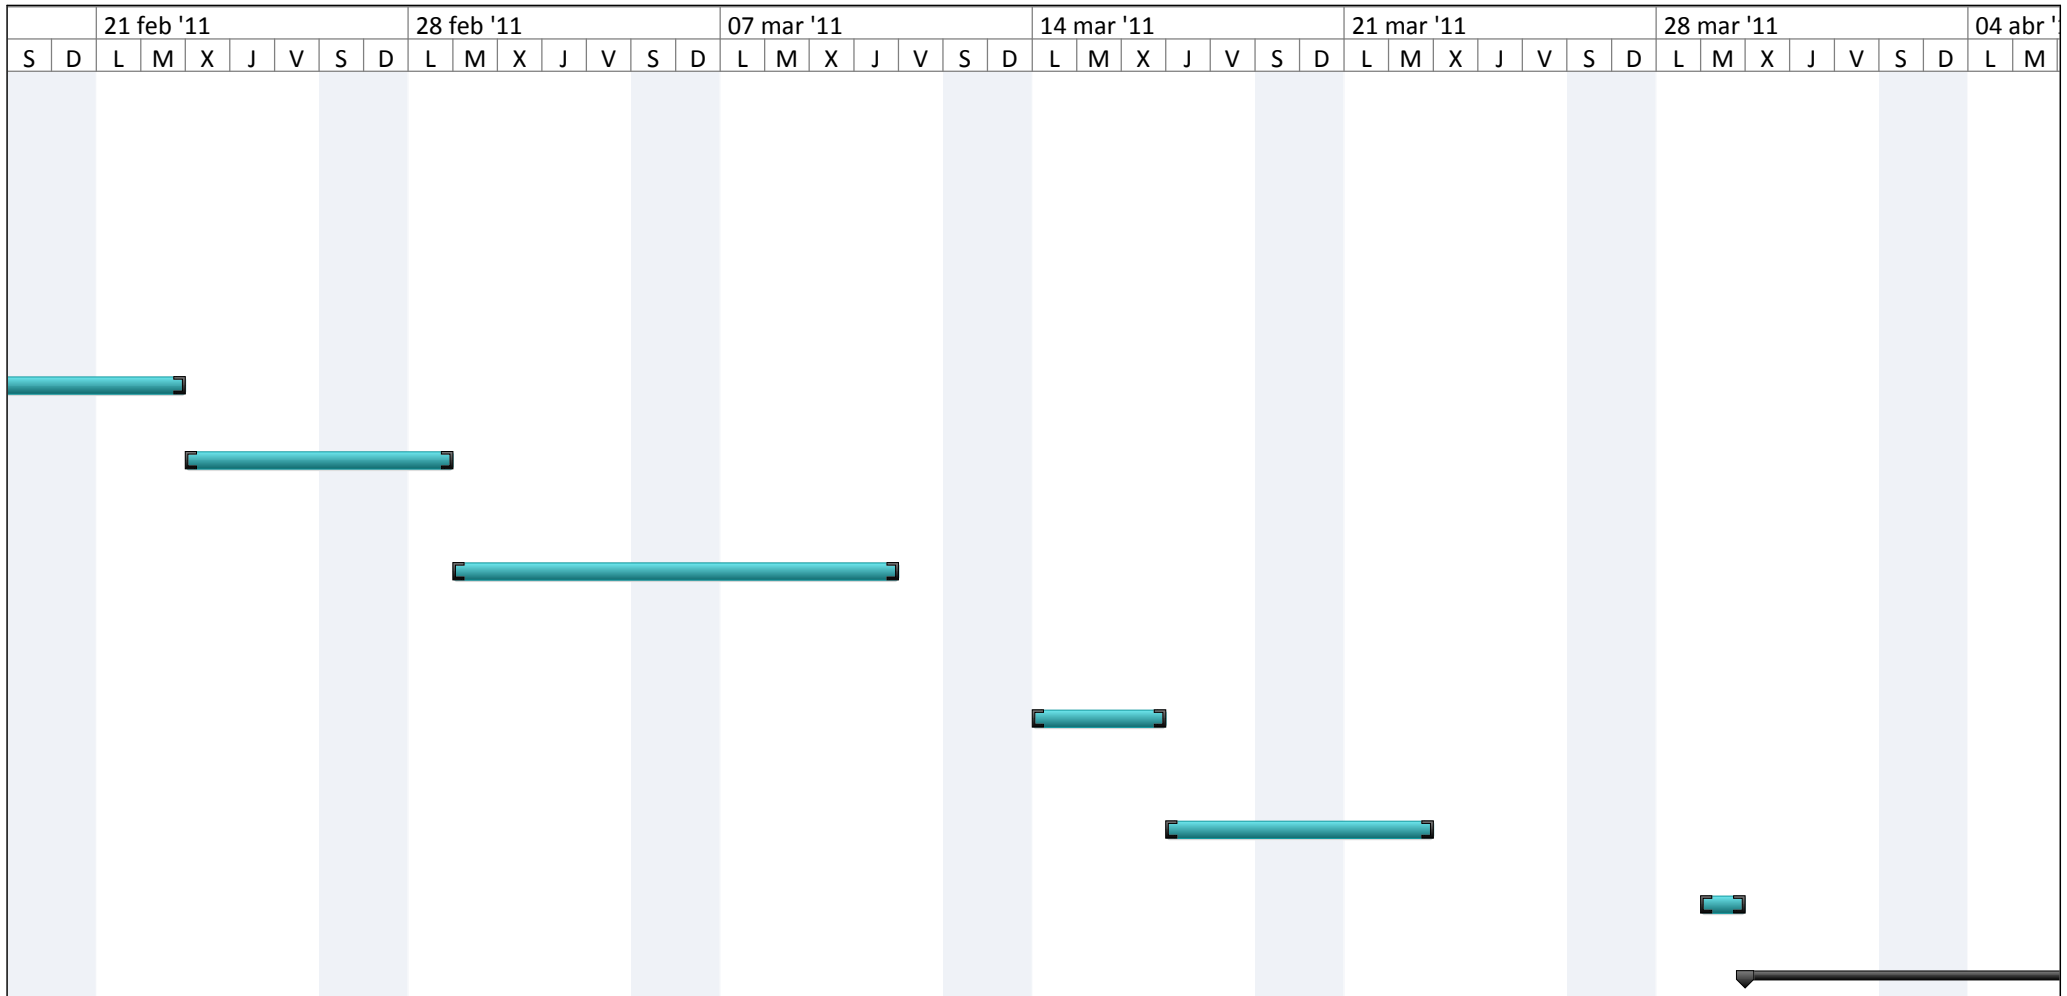

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

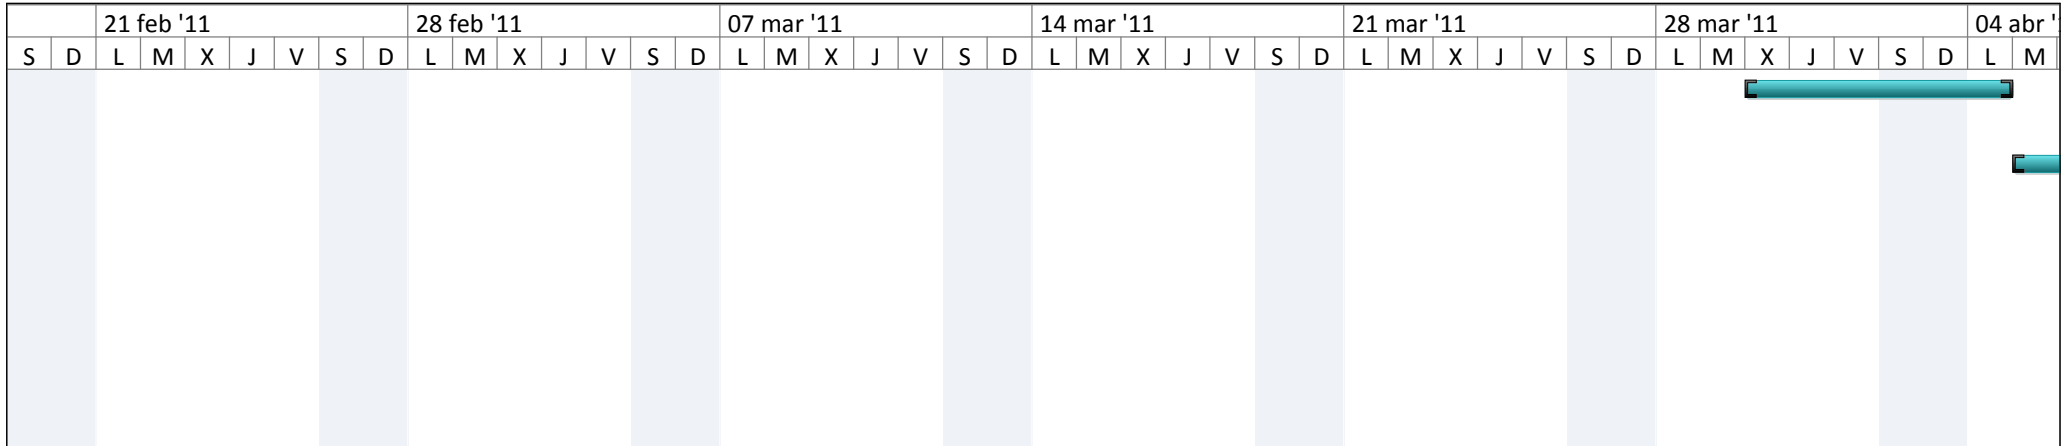


Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

11					11 abr '11					18 abr '11					25 abr '11					02 may '11					09 may '11					16 may '11																
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D




Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

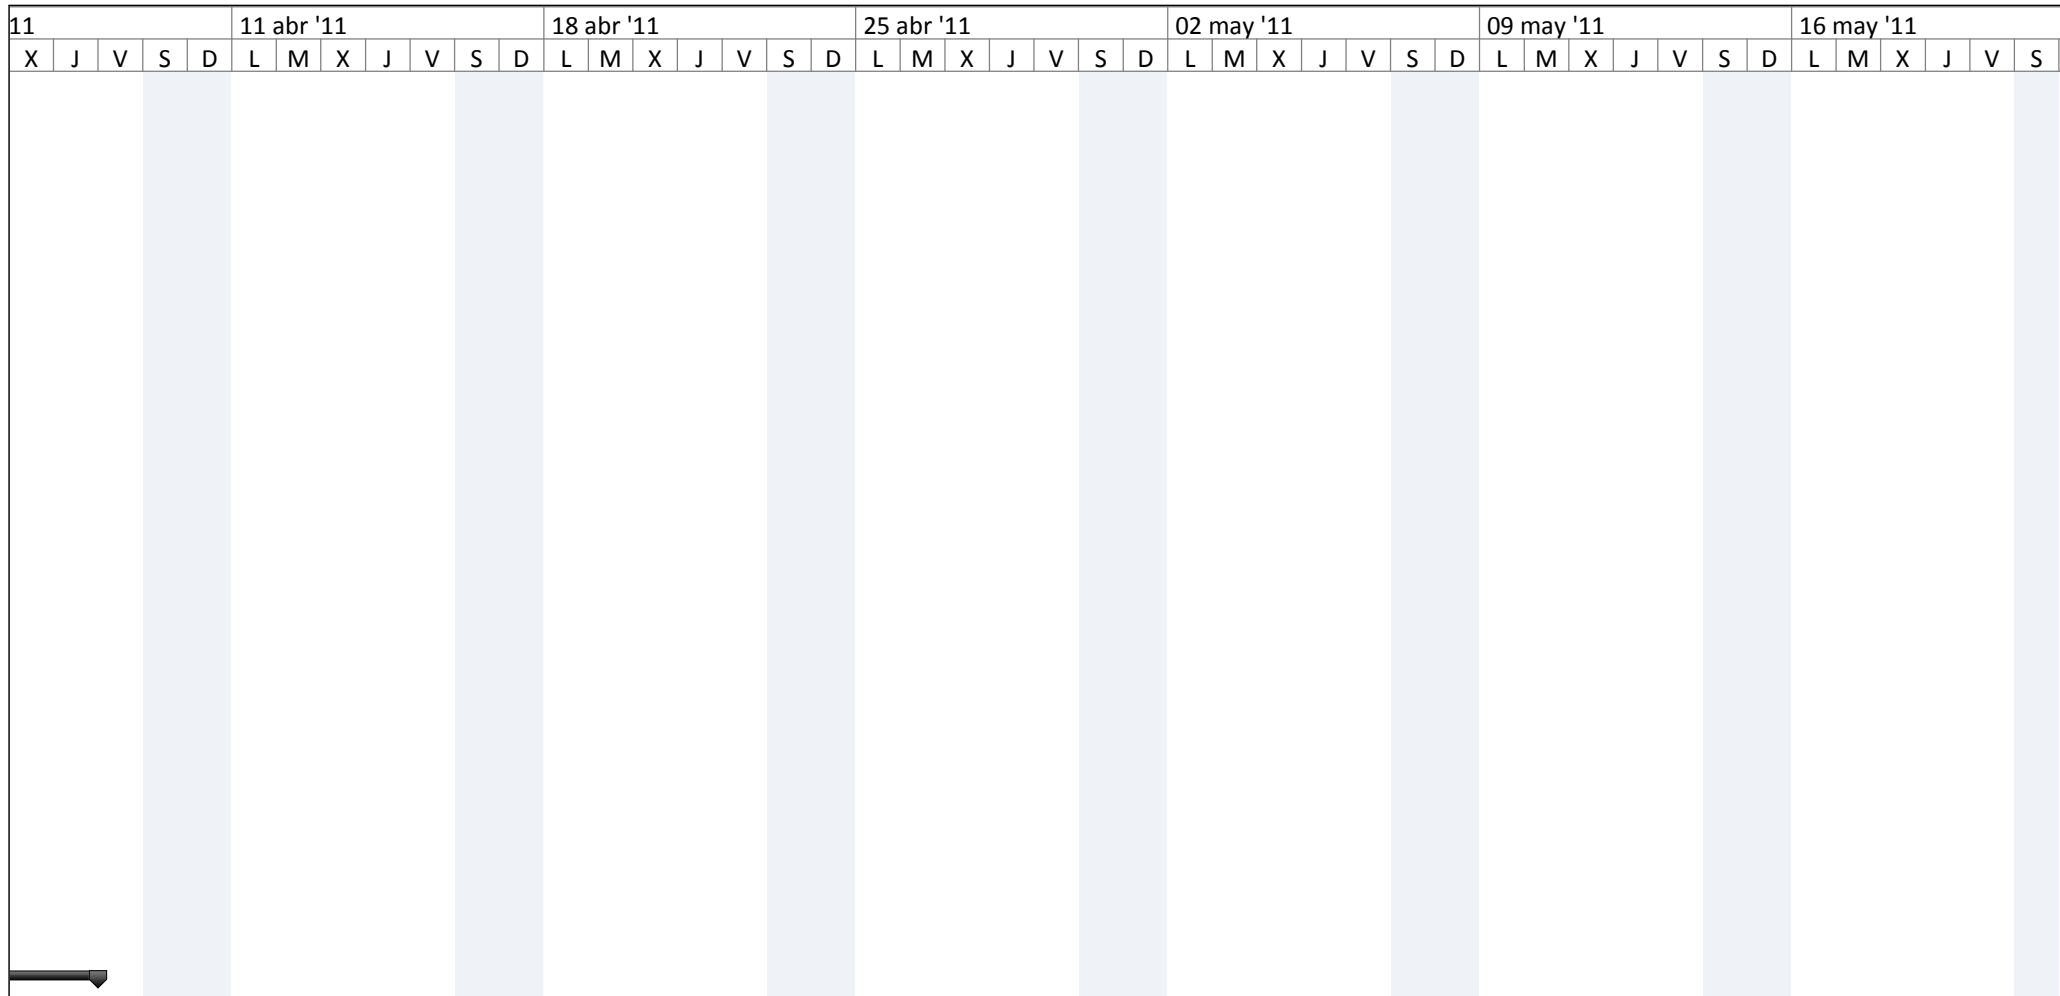

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

23 may '11							30 may '11							06 jun '11							13 jun '11							20 jun '11							27 jun '11							04 jul '11			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

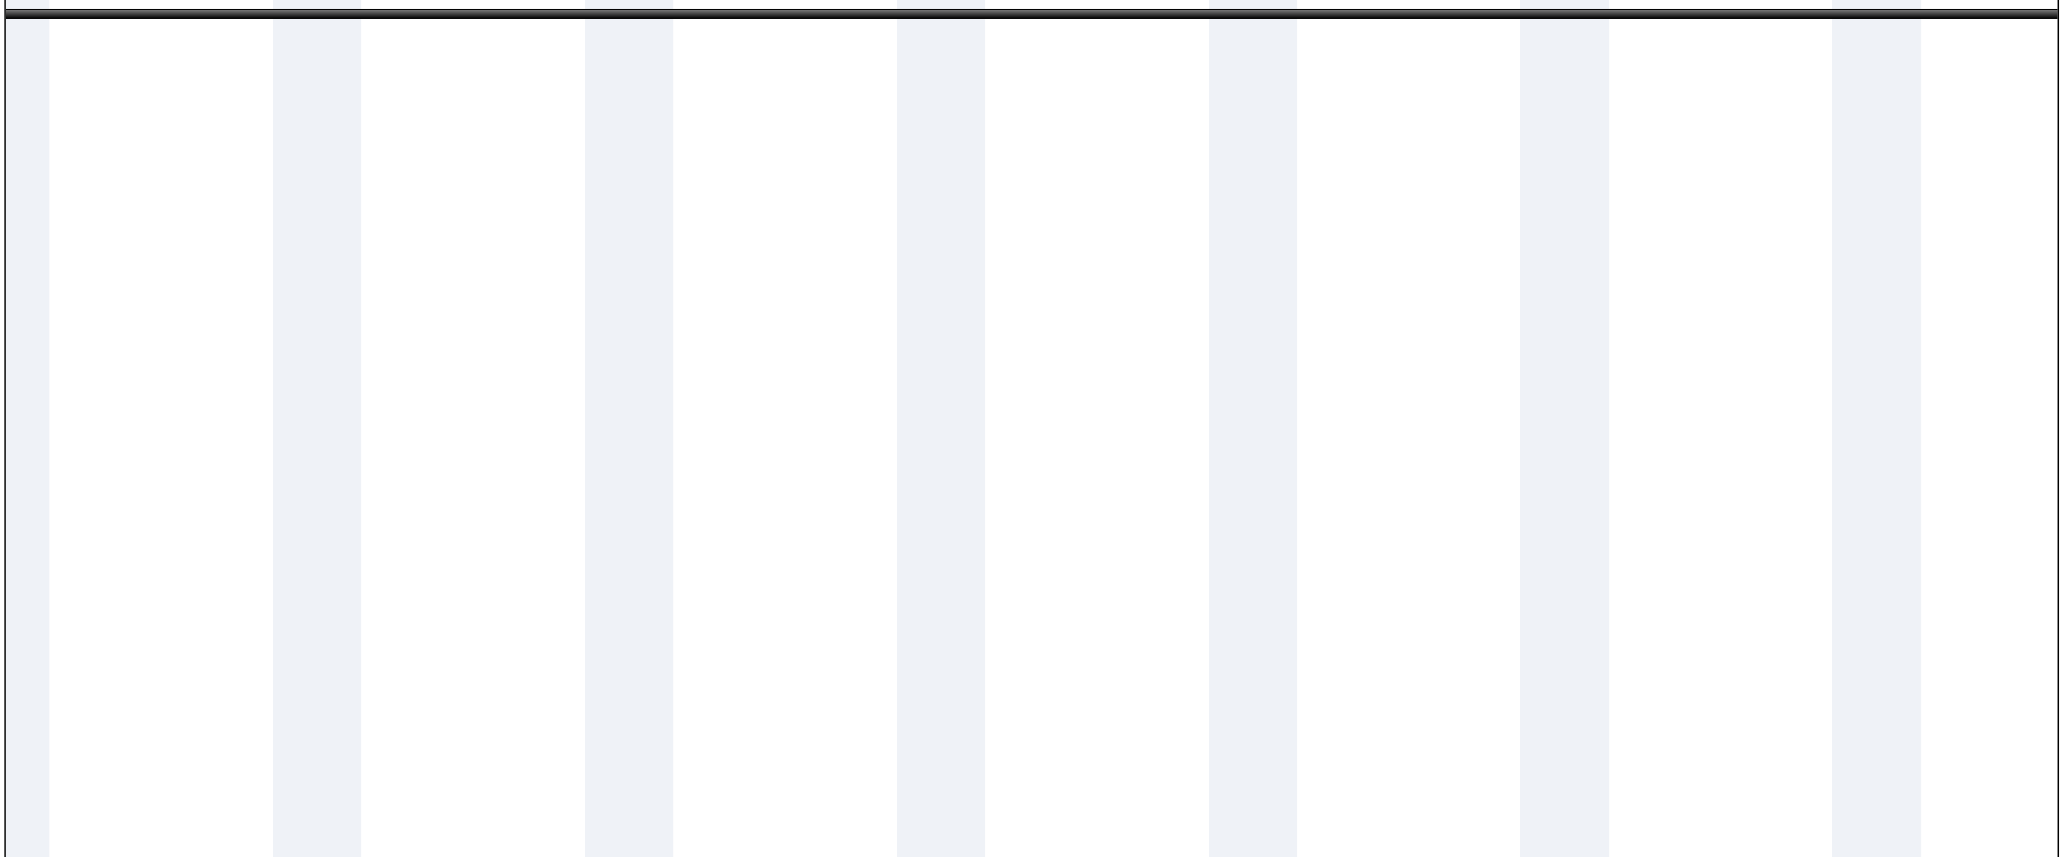

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


23 may '11							30 may '11							06 jun '11							13 jun '11							20 jun '11							27 jun '11							04 jul '11			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


23 may '11							30 may '11							06 jun '11							13 jun '11							20 jun '11							27 jun '11							04 jul '11			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X




Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

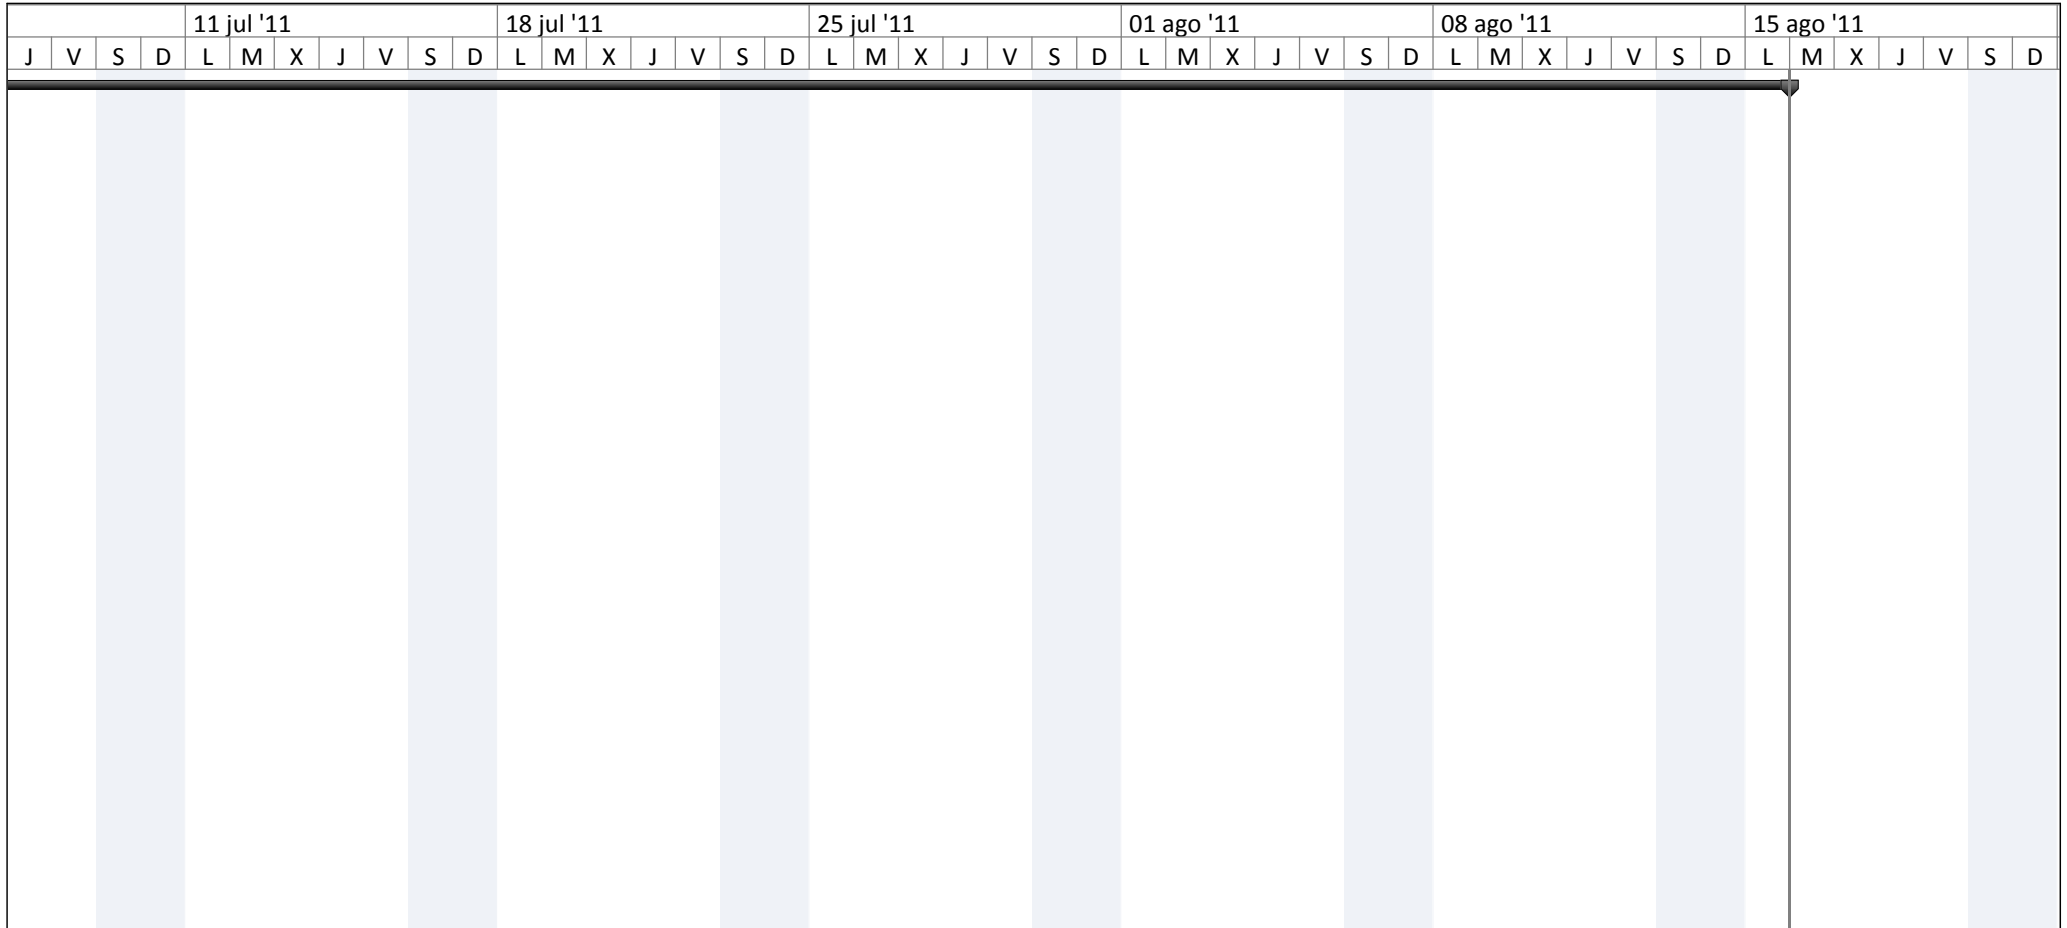

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

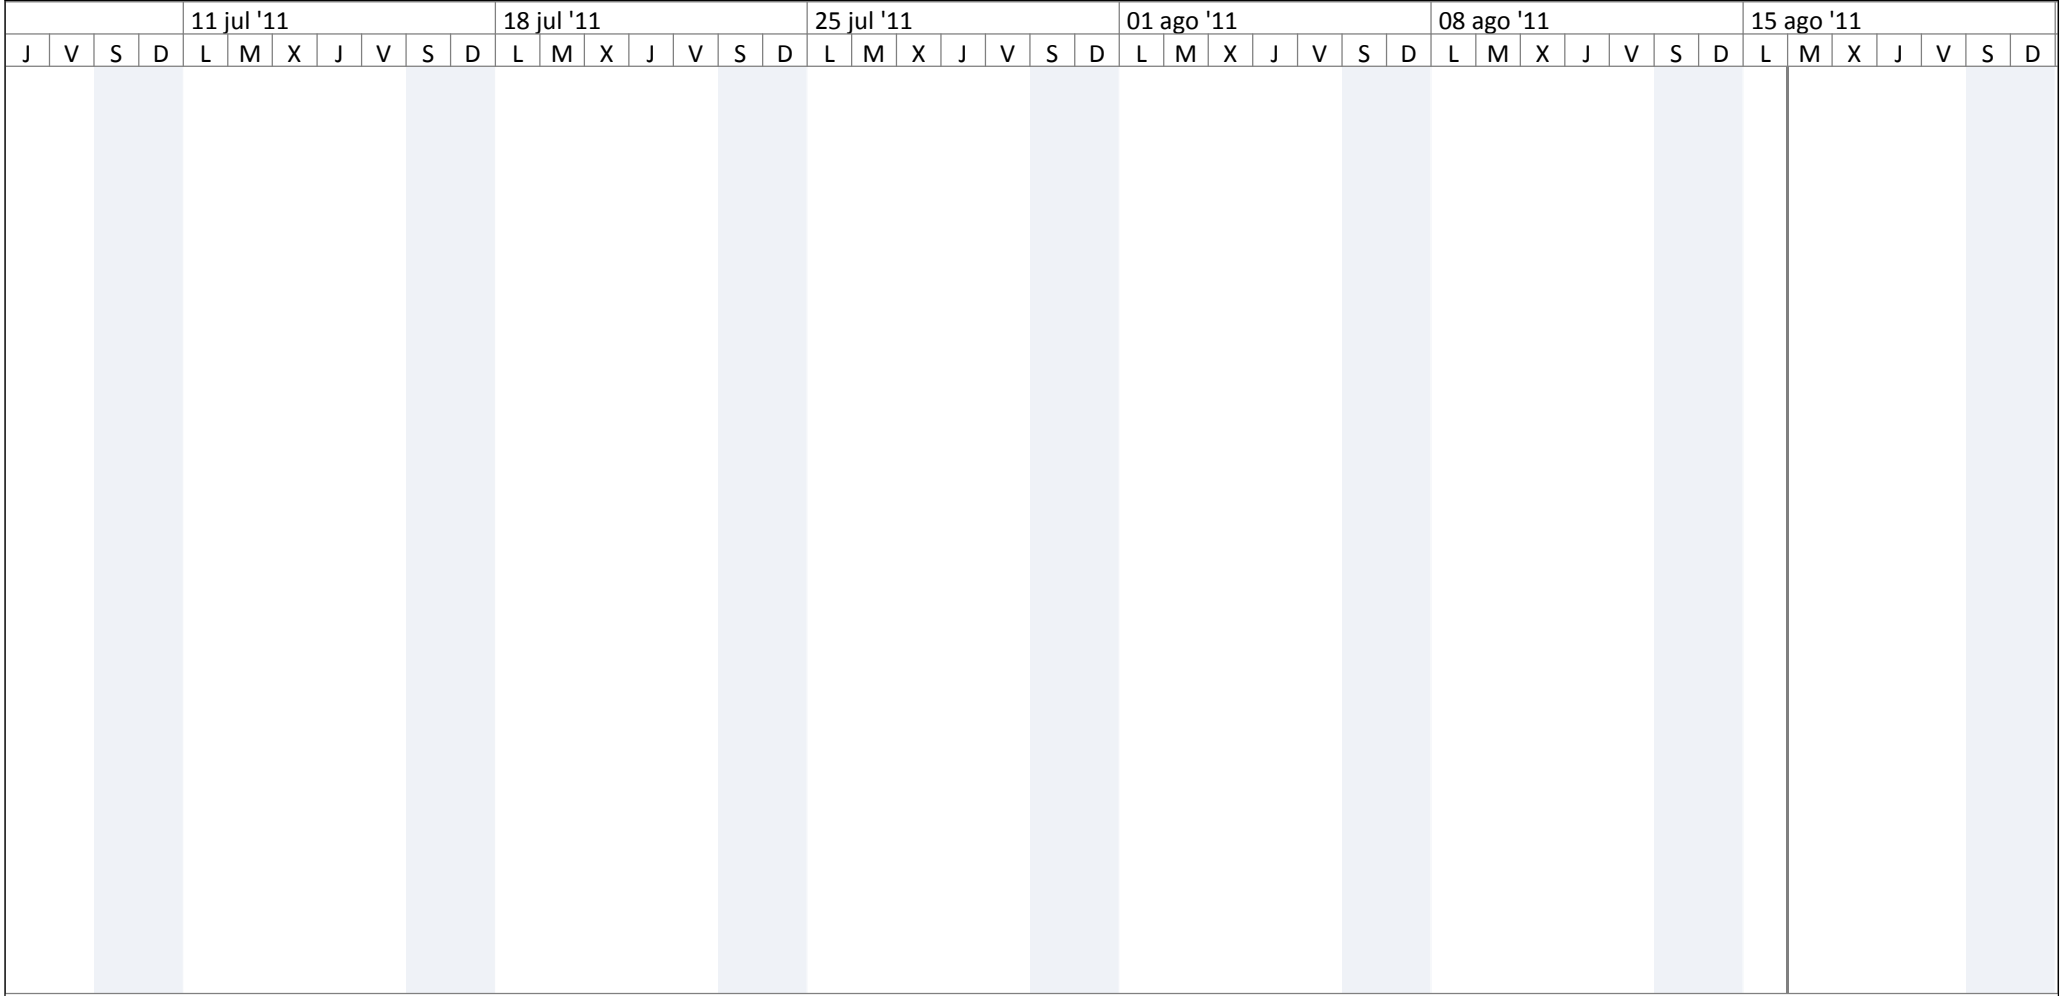

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

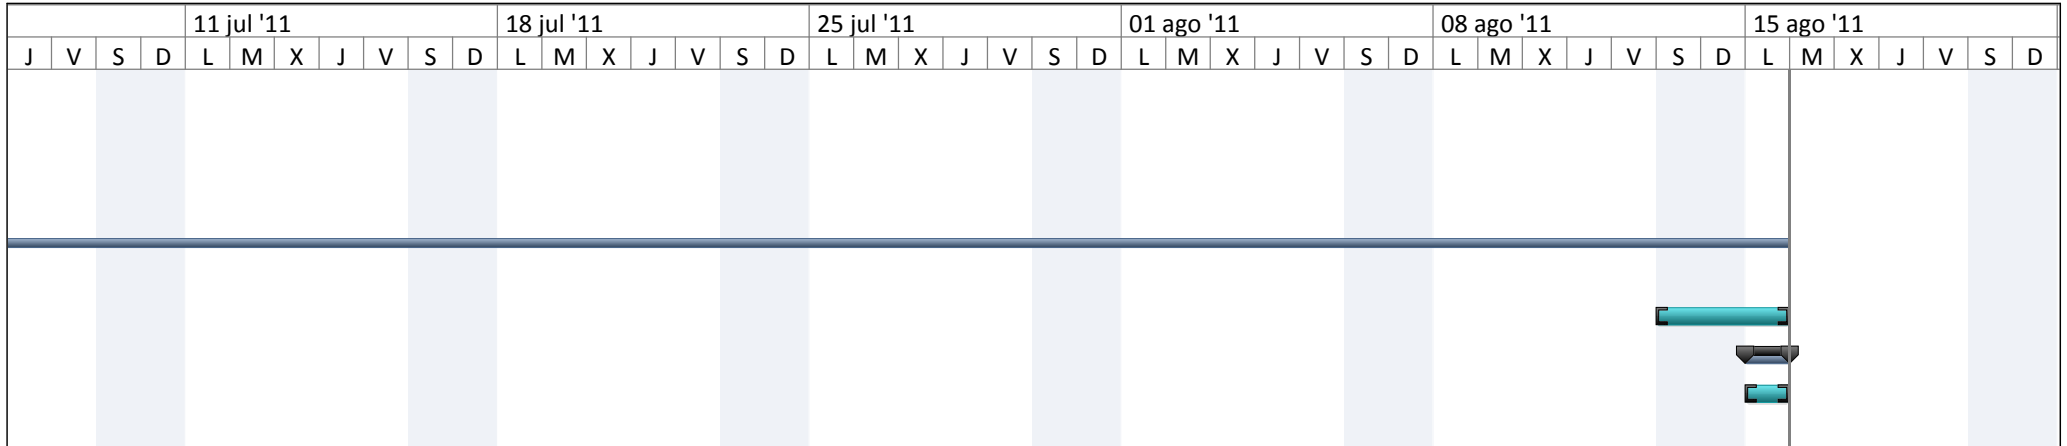

Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: lun 27/12/10	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	
