

Nombre del proyecto:

# INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

## Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073

Sector: Hacienda

**Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

**Entidad:** Uiaf

**Responsable:** Jorge Alberto Torres Salazar

**Horizonte:** 2016 - 2021

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** 05/02/2018


**Seguimiento de:** junio 2018

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

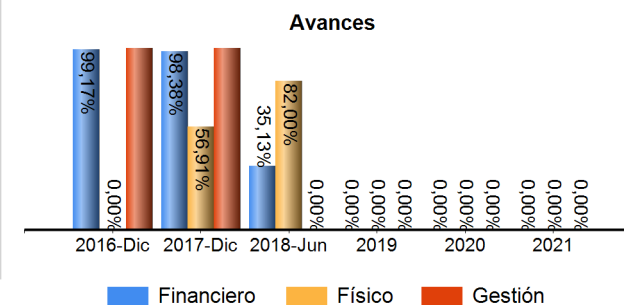

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

**PRODUCTOS**

Plataforma Tecnológica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Plataforma tecnológica Implantada - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	82,0000	90,0000	86,0000	95,56 %
<b>Observaciones :</b> En el mes de junio no se realizaron adquisiciones tecnológicas.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
REALIZAR INTERVENTORIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	PGN	\$1.179.072.000	\$1.179.072.000	\$484.413.887
Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.179.072.000</b>	<b>\$1.179.072.000</b>	<b>\$484.413.887</b>

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Servicios tecnológicos Prestados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Al cierre del mes de junio no se presentan avances para esta meta.					

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Instalar los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$200.000.000</b>	<b>\$200.000.000</b>	<b>\$0</b>

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

infraestructura física

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
infraestructura física Adquirida - <b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados	240,0000	32,5000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
realizar interventoría de las adecuaciones	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Modelo de inteligencia económica y estratégica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-Dic	5.527.840.000	2.213.000.000	1.881.050.000	1.865.522.446	1.865.522.446	1.865.522.446	Financiero 99,17%  Físico 46,00%  Gestión 300,00% 
2017-Dic	3.286.978.000	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Financiero 98,38%  Físico 57,00%  Gestión 147,50% 
2018-Jun	7.372.424.800	1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887	Financiero 35,13%  Físico 82,00%  Gestión 0,00%
2019	1.869.228.720	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%
2020	1.042.737.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%
2021	255.419.760	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2018)

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.379.072.000</b>	<b>1.379.072.000</b>	<b>801.540.558</b>	<b>484.413.887</b>	<b>484.413.887</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,63 %	35,13 %	35,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	82,00 %	82,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	549.407.000	592.072.000	298.298.918	298.298.918	298.298.918
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	629.665.000	587.000.000	503.241.640	186.114.969	186.114.969
	Servicios	Aportes Nacion	200.000.000	200.000.000	0	0	0

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Total		1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887

### > Metas de Producto (BIS)

--

### > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Sistemas de información mejorados	1	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de junio, no se presentan avances para esta meta.			
Diagnosticos Generados	1	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de junio, no se presentan avances para esta meta.			

### > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.379.072.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	35,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



**Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

**Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073
